Nome attività	Durata
Preparazione delle aree di cantiere	10 g
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	5 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g
Apprestamenti del cantiere	4 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto	1 g
Impianti di servizio del cantiere	4 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1 g
Scavi e riprofilature del terreno	47 g
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici	27 g
Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano	20 g
Rinterri e rinfianchi	18 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	8 g
Rinterro di scavo eseguito a mano	10 g
Gabbionate e massi	32 g
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	12 g
Posa di massi al piede dell'opera	5 g
Posa di geostuoia	5 g
Posa di biostuoia	5 g
Posa di georeti o geocelle	5 g
Opere di sostegno	22 g
Realizzazione di opere in terra rinforzata	17 g
Idrosemina	5 g
Percorsi pedonali	8 g
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare	8 g
Smobilizzo del cantiere	7 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	5 g
Smobilizzo del cantiere	2 g

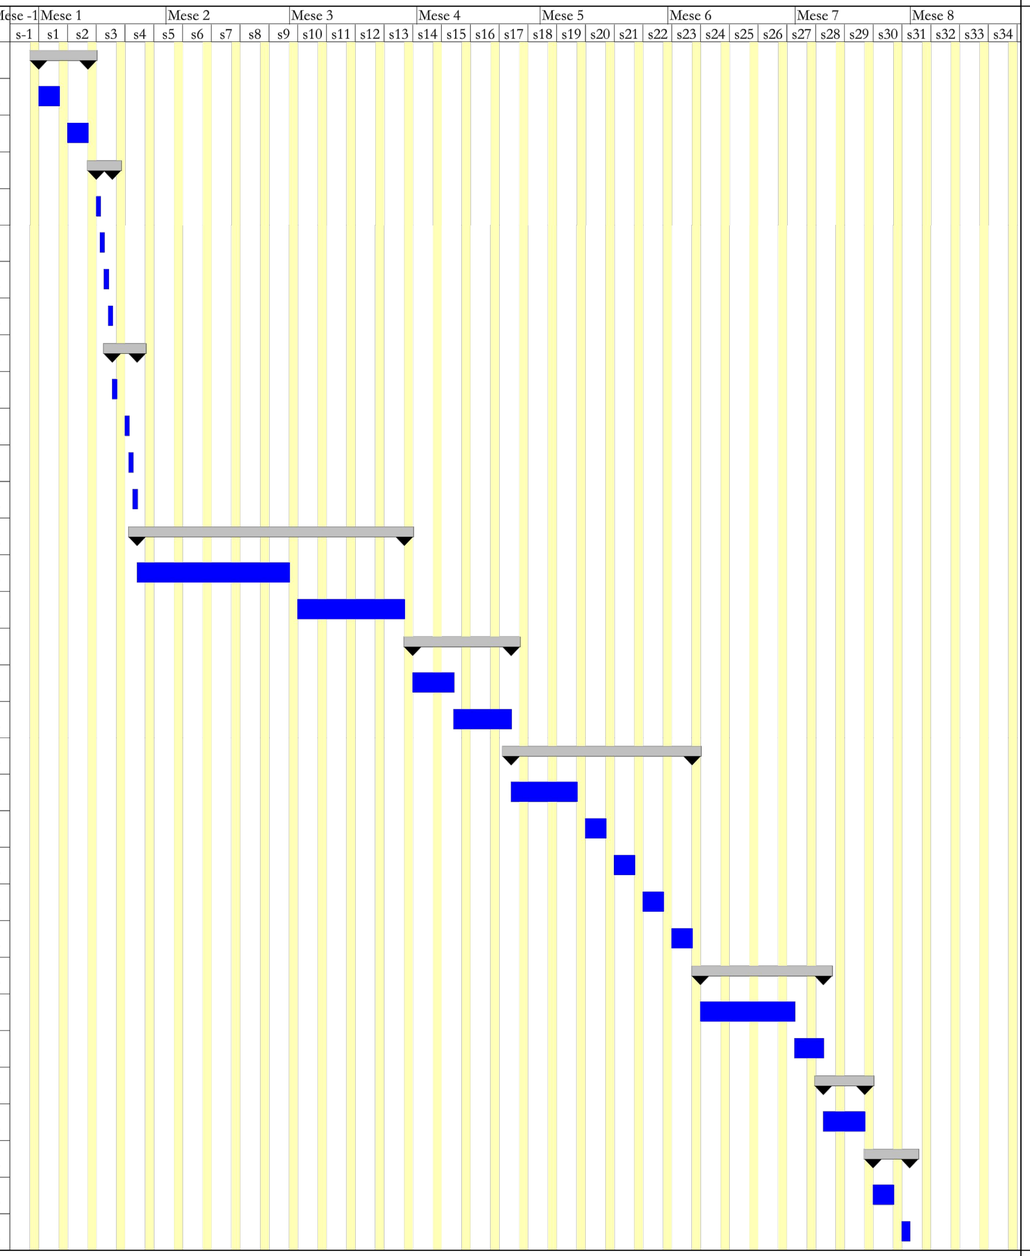

REGIONE SICILIA

Committente

COMUNE DI POZZALLO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Intervento

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA ESONDAZIONE, REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CONFLUENTI ALLA FASCIA COSTIERA EST DEL COMUNE DI POZZALLO
CIG: 9082382AB8 - CUP: C14H20001110001

E - PROGETTO ESECUTIVO

Commessa	Fase	Cap.	El.	Oggetto	Scala
LP2203	P	3	04	CRONOPROGRAMMA	-

Progettista

Ing. Orazio Pellegrino

Gruppo di Lavoro

Ing. Orazio Pellegrino
Ing. Rosario Corvaia
Geol. Ugo Petrina
Ing. Nicoletta Campofiorito
Ing. Andrea Cascio Rizzo
Ing. Rosanna Timpanaro

Impresa ausiliaria

CMP PROGETTI INGEGNERIA ARCHITETTURA SICUREZZA AMBIENTE

Fase

- ☐ I INQUADRAMENTO
- ☐ R RILIEVI ED INDAGINI
- ☐ F STATO DI FATTO
- ■ P PROGETTO

Capitolo

- ☐ 0 GENERALE
- ☐ 1 IDRAULICA
- ☐ 2 CANTIERIZZAZIONE
- ■ 3 SICUREZZA
- ☐ 4 TECNICO-ECONOMICI

Rev.	Data	Nome file	Descrizione	Redatto	Approvato	Verificato
D						
C						
B						
A	09/08/2022	E-P-3-04-A_p0-r1-v Cronoprogramma	Prima emissione	ACR	NC	OP

Visti
